



HARRAN
ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME

VE

DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2017
Şanlıurfa



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	3
1.2 Yasal Dayanaklar	4
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.4 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	7
1.5 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
2. 2016 YILI PROJE UYGULLAMALARI	16
2.1 Devam Eden Projeler	16
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	16
2.2 Tamamlanan Projeler	27
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	27
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu	29
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	33



ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Harran Üniversitesi öğrenci merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı şiar edinmiş bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz bu kapsamda en son teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim verebilmek ve araştırma yapmak üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya odaklanmış ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

2016 yılı yatırım programını değerlendirdiğimizde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV), Merkezi Laboratuvar (HÜMEL) ile Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezinin tamamlanarak faaliyete geçmiş olması Üniversitemizin, Bölgemizin ve Ülkemizin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu merkezlerden, GAP Bölgesinde bulunan tüm üniversiteler, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimciler yararlanabilecektir. Nitelikli eğitim imkânlarına, yeni teknolojik buluşlara destek verecek, bölgeye yeni yatırımları cazip kılacak ve ulusal-uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatları yaratacak bu Merkezler vasıtasıyla bölgemizdeki olanaklar önemli bir fırsata dönüşebilecektir. Bunların dışında 2016 yılı yatırım programında yer alan projelere ait bilgiler, yapılan harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların ülkemize ve milletimize faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN

Rektör



1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri

3) İkinci Öğretim Gelirleri

4) Örgün Öğretim Gelirleri

5) Yaz Okulu Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.



1.2 Yasal Dayanaklar:

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 inci maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Harran Üniversitesi, bünyesindeki eğitim-öğretim kurumları ile her geçen gün gelişme yolunda attığı adımlara yenilerini eklemiş ve bugün itibarıyla; 13 fakülte, 3 enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 11 Meslek Yüksekokulu, 11 Araştırma Uygulama Merkezi ve Araştırma Uygulama Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmetleri faaliyetlerini sürdürerek, bir yandan nitelikli öğrenci yetiştirirken, diğer yandan bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı kendisine hedef edinmiştir.





ENSTİTÜLERİMİZ

- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

YÜKSEKOKULLARIMIZ

- Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
- Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Viranşehir Sağlık Yüksekokulu
- Devlet Konservatuvarı

FAKÜLTELERİMİZ

- Ziraat Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Dış Hekimliği Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi

MESLEK YÜKSEKOKULARIMIZ

- Siverek MYO
- Suruç MYO
- Bozova MYO
- Birecik MYO
- Hilvan MYO
- Sağlık Hizmetleri MYO
- Viranşehir MYO
- Ceylanpınar MYO
- Akçakale MYO
- Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO
- Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

- GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
- Harran Üniversitesi Ortadoğu araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
- Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
- Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
- Güney Doğu Anadolu Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
- Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
- Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi



Üniversitemizde hizmet verilen kapalı alanların 2016 yıl sonu itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yerleşke Adı	Bulunduğu Yer	Hizmet Alanları (m ²)						
		Araştırma Alanları (Lab.v.b.)	Eğitim Alanları (Derslik v.b.)	Sosyal Alanlar (Kantin,Kafe, Yemekhane,Spor, Sağlık,Kültür(v.b.)	İdari Alanlar	Barınma Alanları (Lojman, Misafirhane v.b.)	Diger Alanlar	Toplam
Osmanbey Yerleşkesi	Şanlıurfa /Haliliye	48.403,83	42.421,34	96.223,04	78.216,91	15.223,42	33.777,08	314.265,62
Yenişehir Yerleşkesi	Şanlıurfa /Haliliye	676,50	2.029,50	2.104,68	9.340,96	0,00	3.940,60	18.092,24
Eyyubiye Yerleşkesi	Şanlıurfa /Eyyubiye	4.513,80	9.684,63	3.714,03	5.902,47	8.253,35	1.629,12	33.697,40
Şairnabi Yerleşkesi	Şanlıurfa /Haliliye	18.238,74	0,00	2.726,58	4.093,55	8.396,60	0,00	33.455,47
Sarayönü Yerleşkesi	Şanlıurfa /Eyyubiye	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	13.980,00	14.523,40
Yerleşke Dışı Lojmanlar	Şanlıurfa /Merkez	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
Eski Urfa (Kültür) Evleri	Şanlıurfa /Eyyubiye	0,00	0,00	2.894,77	0,00	0,00	0,00	2.894,77
Bozova Myo	Bozova	16,63	155,86	87,21	289,67	0,00	0,00	549,37
Hilvan Myo	Hilvan	244,10	603,10	207,00	1.974,42	0,00	0,00	3.028,62
Suruç Myo	Suruç	60,00	502,50	80,00	1.419,97	0,00	0,00	2.062,47
Siverek Myo	Siverek	278,10	715,80	489,00	3.317,10	0,00	0,00	4.800,00
Viranşehir Myo	Viranşehir	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Akçakale Myo	Akçakale	52,00	798,00	247,00	4.635,00	0,00	2.201,59	7.933,59
Birecik Myo	Birecik	250,00	1.160,00	1.993,60	493,89	0,00	0,00	3.897,49
Ceylanpınar Myo	Ceylanpınar	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Toplam		73.197,70	59.610,73	111.667,87	11.0763,94	40.541,05	59.687,79	455.469,08



Harran Üniversitesi'nde 10'u yabancı uyruklu olmak üzere 989 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 100'ü profesör, 80'i doçent, 269'u yardımcı doçent, 155'i öğretim görevlisi, 51'i okutman, 16'sı uzman ve 318'i araştırma görevlisidir. Ayrıca, 864 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir.

1.4 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6), sağlık sektöründe iki (2), diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe iki (2) olmak üzere toplam on (10) adet proje yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, açık ve kapalı spor tesisleri, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

➤ **Spor :** Belirlenen hedefler çerçevesinde, 2016 yılının son ayında ihaleye çıkılmış ancak sözleşme 2017 yılının ilk ayında imzalandığı için spor sektöründe herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2017 Yılında bakım onarım çalışmaları 2017 yılı için verilen ödenek çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

➤ **Sağlık :** 2016 yılı yatırım programında yer alan 1994I000820 numaralı 600 Yataklı Hastane İnşaatı Projesine başlangıçta 16.800.000 TL Makine Teçhizat alımı için ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneye Üniversitemiz Net Finansmanından 10.000.000,00 TL eklenmiş olup toplamda 26.800.000 TL olmuş, bu ödeneğin 14.510.553,34-TL'si harcanarak proje için ayrılan toplam ödeneğin %54'ü kullanılmıştır.

Sağlık sektörünün bir diğer projesi olan 2016I000250 numaralı Muhtelif İşler (GAP), toplamda 2.200.000TL başlangıç ödeneği verilmiş bu ödeneğin 133.753,00 TL'si Diğer Makine ve Teçhizat alımlarında kullanılmış, 709.994,64TL'si Hastane Büyük Onarımı için kullanılmış ve 1.000.000,00 TL yıl içerisinde Net finansmanımızdan Büyük onarıma ekleme yapılmıştır. Toplam ödeneğin %26'sı harcanmıştır.

➤ **Muhtelif İşler:** Yatırım programında 2016H032550 proje numarasıyla yer alan muhtelif işler için 5.280.000,00 TL ödenek ayrılmış Üniversitemiz Net Finansmanından 1.500.000,00 TL, eklenmiş olup toplamda 6.780.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 5.720.634,04 TL si harcanarak proje tamamlanmıştır.

➤ **Eğitim:** Proje numarası 2011H032430 olan Derslik ve Merkezi Birimler için 11.422.000,00 TL ödenek ayrılmış, Üniversitemiz Net Finansmanından 3.500.000,00 TL, 578.000,00 TL altyapı projesinden aktarılmış ve toplam 15.500.000,00 TL ödeneğin 15.480.344,52 TL'si harcanmış ve proje 2016 yılında da devam edecektir.

1994H031470 Proje numaralı Kampüs alt Yapı İnşaatı için 3.500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup 2.075.090,06 TL'si harcanmış proje 2017 yılında devam edecektir.

2016H032560 Proje numaralı Kütüphane yayın alımı için 700.000TL ödenek ayrılmış olup 691.266,56 TL si harcanmış ve proje tamamlanmıştır.





Eğitim Sektörünün bir diğer projesi olan 2016H032540 numaralı çeşitli ünitelerin etüt projesi için 98.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 240.000,00 TL eklenmiş toplam ödenek 338.000,00 TL olmuştur. Bu projede 337.024,052 TL harcanmış ve proje tamamlanmıştır.

1.5 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2016 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin toplam tutarı 44.500.000,TL iken yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 10.000.000,00 TL Sağlık Sektöründe yer alan Hastane İnşaatı Makine Teçhizat Alım projesine, 1.000.000,00 TL Sağlık Muhtelif İşler Projesi içinde yer alan Hastane Büyük Bakım Onarım projesine eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan Eğitim Muhtelif İşler (GAP) projesi altında olan Diğer Makine Teçhizat Alımları Projesine 1.500.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 3.500.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiş ayrıca Eğitim Sektörünün bir diğer projesi olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Projesine Üniversitemiz Net Finansmanından 240.000,00 TL eklenmiştir. Böylelikle Üniversitemiz Net finansmanından toplamda Yatırım Projelerine 16.240.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

DKH Sosyal / Teknolojik Araştırmalar sektöründe Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine 1.500.000,00 TL ödenek verilmiş bu projenin geçmiş dönemlerden devreden 4.202.620,85 TL ile yıl ödeneği 5.702.620,85 TL olmuştur. Bu projenin yıl içindeki harcaması ise 5.475.015,73 TL dir. Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği AR-Ge Merkezine de 3.500.000,00 TL. ödenek bağlanmış geçmiş dönemlerden devreden 3.965.940,49 TL. ile toplam yıl ödeneği 7.465.940,49 olmuştur. Bu projenin yıl içindeki harcaması ise 4.502.034,42 TL dir.

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ihalelere çıkılmış ve bina inşaatlarına başlanmıştır. Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına göre uygun olacak şekilde bitirilmesi hedeflenmektedir.


Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir. Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.



2016 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı							
Proje No	Proje Adı	KBÖ	Net Finansmandan Ekleme	Yedek Ödenekt en Ekleme	Projeler Arası Ödenek Değişikliği		Toplam Kaynak
					Düşülen	Eklenen	
2012K120690	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000,00					1.500.000,00
2011K120300	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi	3.500.000,00					3.500.000,00
1994I000820	Hastahane İnşaatı 600 yataklı (104.700 m ²) İnşaatı Makine teçhizat	16.800.000,00	10.000.000,00				26.800.000,00
2016I000250	Muhtelif İşler (Hastane Büyük Onarım Makine Teçhizat)	1.200.000,00	1.000.000,00				2.200.000,00
1998H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000,00					500.000,00
2016H032550	Muhtelif İşler (GAP)	5.280.000,00	1.500.000,00				6.780.000,00
2011H032430	Derslik ve Merkezi Birimler	11.422.000,00	3.500.000,00			578.000,00	15.500.000,00
2016H032560	Kütüphane Yayın Alımı	700.000,00					700.000,00
1994H031470	Kampüs Altyapı İnşaatı	3.500.000,00			578.000,00		2.922.000,00
2016H032540	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	98.000,00	240.000,00				338.000,00
Genel Toplam		44.500.000,00	16.240.000,00		578.000,00	578.000,00	60.740.000,00



Yatırımların Finansal Dağılım Yüzdeleri




Grafiğimizden de anlaşılacağı gibi 2016 yılı yatırım ödeneklerindeki en büyük finansman kaynağını %73 ile Hazine yardımı oluşturmaktadır.



2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

Sermaye Giderleri	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
	44.500.000,00	16.240.000,00	0,00	60.740.000,00	44.658.666,68	73,52
06.1 Mamul Mal Alımları	22.788.000,00	11.500.000,00	0,00	34.288.000,00	21.364.343,72	62,31
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	131.431,40	65,72
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.520.000,00	3.740.000,00	0,00	22.260.000,00	20.892.465,10	93,86
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.524,26	47,26
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.792.000,00	1.000.000,00	0,00	3.792.000,00	2.175.902,20	57,38

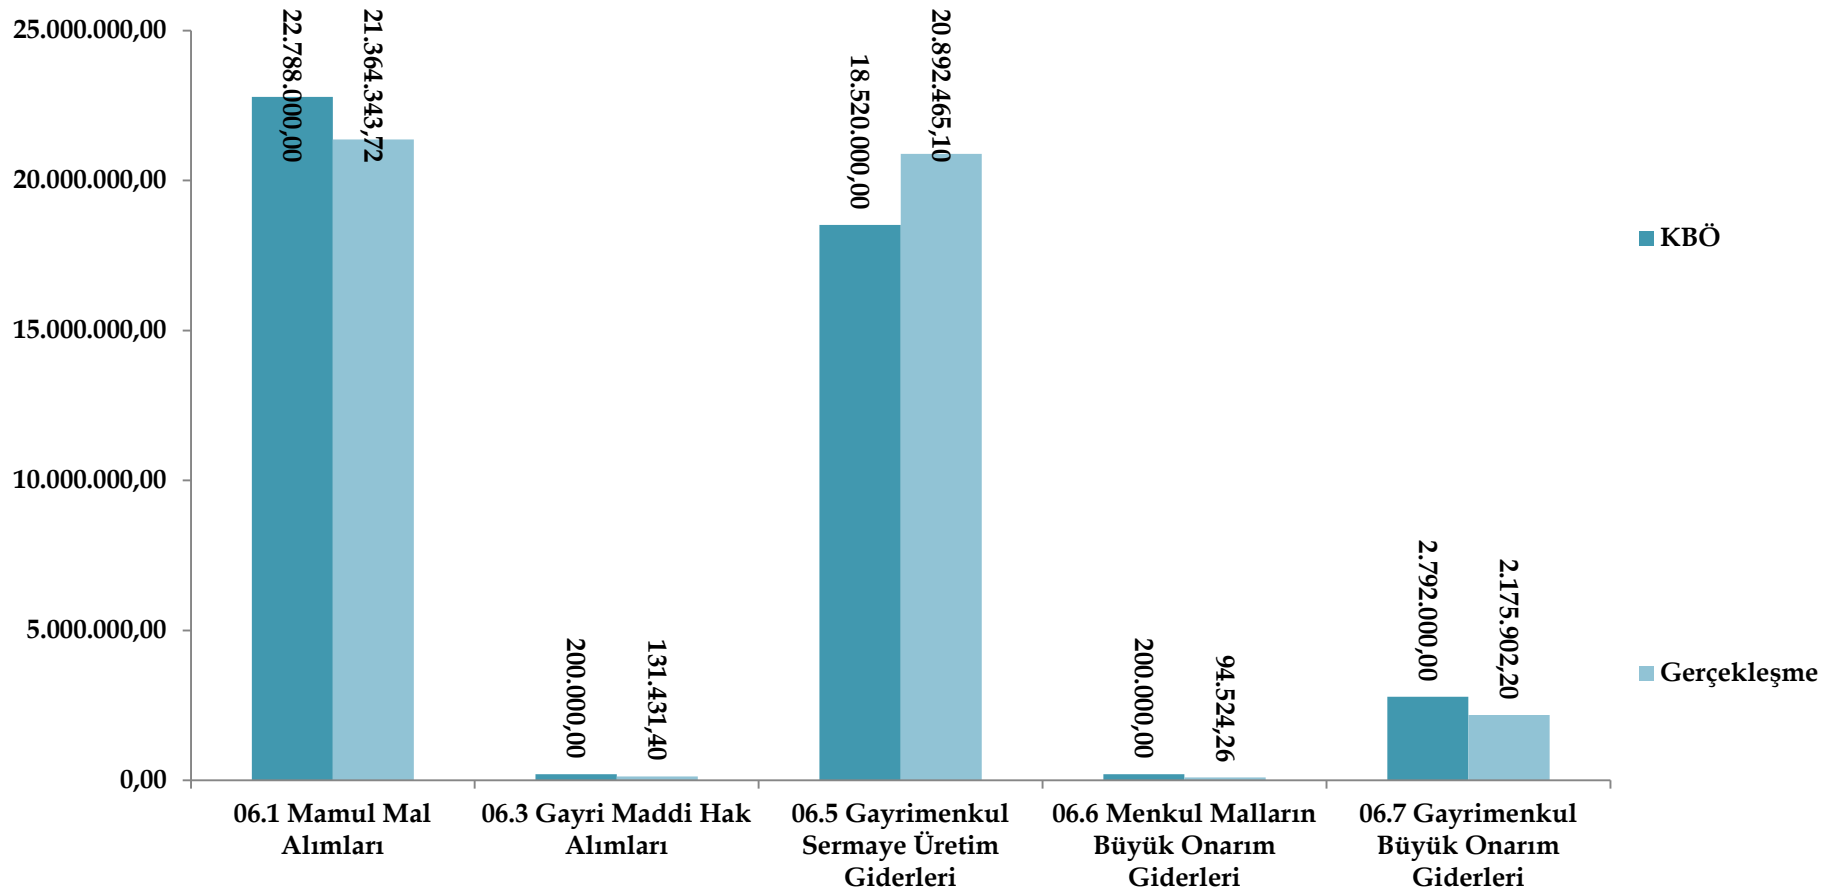




2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları

	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
01 Personel Giderleri	115.464.000,00	116.144.520,00	115.368.570,40	775.949,60	99,33
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.047.000,00	17.485.100,00	17.400.240,03	84.859,97	99,51
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	24.043.000,00	33.790.121,00	29.294.404,83	4.495.716,17	86,70
05 Cari Transferler	4.321.000,00	4.337.200,00	4.335.687,04	1.512,96	99,97
06 Sermaye Giderleri	44.500.000,00	60.740.000,00	44.658.666,68	16.081.333,32	73,52
Toplam	205.375.000,00	232.496.941,00	211.057.568,98	21.439.372,02	90,78




Sermaye Giderlerinin Yıl Sonu Ödeneği İçindeki Payı





Sermaye Giderlerinin Yıl Sonu Gerçekleşmesi İçindeki Payı

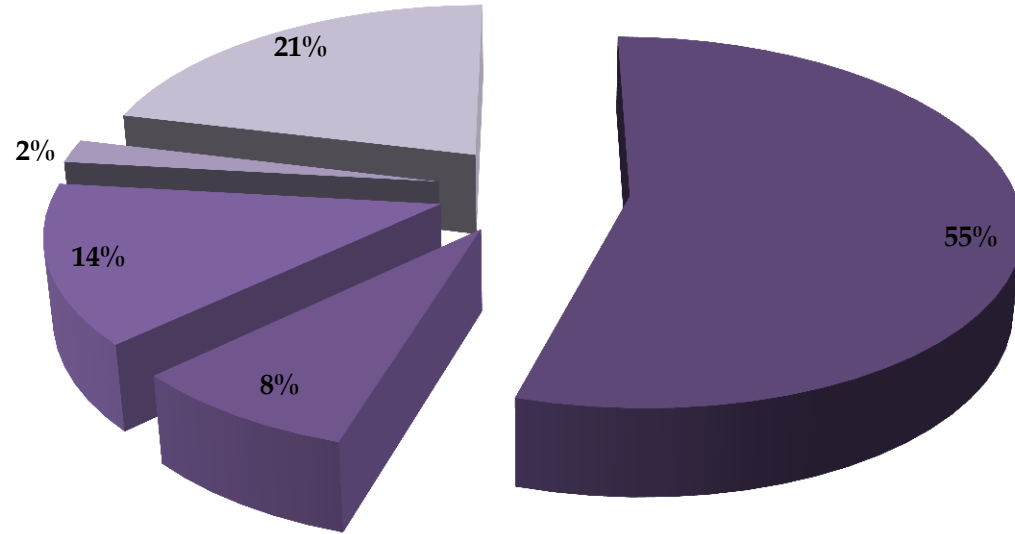

- 01 Personel Giderleri
- 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
- 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
- 05 Cari Transferler
- 06 Sermaye Giderleri



2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1

Proje No	2016H051060
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	500
Önceki Yıllar Harcaması	0
İlgili Yıl Ödeneği	500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	500
İlgili Yıl Harcaması	0
Nakdi Gerçekleşme %	0
Fiziki Gerçekleşme %	0
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Proje kapsamında; Üniversitemiz Osmanbey Kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun zemininde ve stadyumda bakım onarım çalışması yapılacaktır. Söz konusu işlerin ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2016 yılı içerisinde harcama yapılamadı. 2017 yılı için 1.000.000,00 TL. Ödeneğe ihtiyaç olacaktır.
2016 yılı Uygulama Sonuçları	Yerleşke Alanında Yapılaşma Artıkça Açık Spor Tesislerine ihtiyaç duyulacaktır.
Öneriler ve Sorunlar	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



Proje No	1994H031470
Proje Adı	Kampus Altyapı İnşaatı
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2017
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	83.000
Önceki Yıllar Harcaması	78.529
İlgili Yıl Ödeneği	3.500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	2.922
İlgili Yıl Harcaması	2.075
Nakdi Gerçekleşme %	59
Fiziki Gerçekleşme %	97
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Yerleşke içerisinde bulunan yapıların ihtiyacı olan Yol, Su, Elektrik, Atık suyu, Yağmursuyu, Merkezi Isıtma, Doğalgaz hattı ve dönüşümü, çevre düzenleme peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yerleşkenin Master Planı sonucuna göre yeni projeler ve çalışmalar devam edecektir.
2016 yılı Uygulama Sonuçları	Yıl ödeneği içerisinde Eyyübiye Yerleşkesinde kalan Altyapının yenilenmesi çalışmaları tamamlanmış olup. İhale aşamasındadır. Osmanbey Yerleşkesi yollarının Kilitli Parke taşı ile döşenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
Öneriler ve Sorunlar	Ödeneğin yeterli olması durumunda, Eyyubiye Yerleşkesinin yollarının yapılması ve Osmanbey Yerleşkesinde kalan yollar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



HARRAN
UNİVERSİTESİ

2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





3

Proje No	2011H032430
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2018
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	70.000
Önceki Yıllar Harcaması	39.766
İlgili Yıl Ödeneği	11.422
İlgili Yıl Revize Ödeneği	15.500
İlgili Yıl Harcaması	15.479
Nakdi Gerçekleşme %	100
Fiziki Gerçekleşme %	79
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	I. Merkezi derslik binası II. Merkezi kütüphane binası III. Viranşehir myo binası IV. Ceylanpınar myo binası V. Öğrenci Yaşam Merkezi Binası Tamamlanmıştır.
2016 yılı Uygulama Sonuçları	✓ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2017 Haziran sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. ✓ Rektörlük Hizmet Binası projeleri tamamlanmış olup, ihalesi yapıldı İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
Öneriler ve Sorunlar	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



HARRAN
UNİVERSİTESİ

2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





Proje No	1994I000820
Proje Adı	Hastane İnşaatı (600 Yataklı 117.972,84 m ²)
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2017
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	362.687
Önceki Yıllar Harcaması	323.178
İlgili Yıl Ödeneği	16.800
İlgili Yıl Revize Ödeneği	26.800
İlgili Yıl Harcaması	14.511
Nakdi Gerçekleşme %	54
Fiziki Gerçekleşme %	93
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Bina İnşaatı, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Makine Teçhizat Donanımı devam etmektedir.
2016 yılı Uygulama Sonuçları	İnşaat tamamlandığı için Yıl ödeneğinden inşaata harcama yapılmamıştır. Yıl ödeneğinden 14.511 TL. Makine ve Teçhizat alımına harcanmış olup devam etmektedir.
Öneriler ve Sorunlar	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



HARRAN
UNİVERSİTESİ

2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





Proje No	2012K120300
Proje Adı	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	16.310
Önceki Yıllar Harcaması	12.810
İlgili Yıl Ödeneği	3.500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	7.465
İlgili Yıl Harcaması	4.509
Nakdi Gerçekleşme %	60
Fiziki Gerçekleşme %	68
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Bina İnşaatı, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Makine Teçhizat Donanımı devam etmektedir.
2016 yılı Uygulama Sonuçları	18.10.2016 tarihinde inşaatı tamamlanmıştır. Yıl ödeneğinden 4.155 TL. İnşaata harcama yapılmıştır. Yıl ödeneğinden 354 TL. Makine ve Teçhizat alımına harcanmış olup devam etmektedir.
Öneriler ve Sorunlar	Makine Teçhizat için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.



HARRAN
UNİVERSİTESİ

2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





Proje No	2012K120690
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2016
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	11.555
Önceki Yıllar Harcaması	10.055
İlgili Yıl Ödeneği	1.500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	5.702
İlgili Yıl Harcaması	5.475
Nakdi Gerçekleşme %	96
Fiziki Gerçekleşme %	85
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Bina İnşaatı, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Makine Teçhizat Donanımı devam etmektedir.
2016 yılı Uygulama Sonuçları	✓ 25.10.2016 tarihinde inşaatı tamamlanmıştır. ✓ Yıl ödeneğinden 5.112 TL. İnşaata harcama yapılmıştır. ✓ Yıl ödeneğinden 363 TL. Makine ve Teçhizat alımına harcanmış olup devam etmektedir.
Öneriler ve Sorunlar	Makine Teçhizat için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.



HARRAN
UNİVERSİTESİ

2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1

Proje No	2016H032540
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016

2

Proje No	2016H032550
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP) Eğitim
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016

3

Proje No	2016H032560
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016

4

Proje No	2016H000250
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP) Sağlık
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016



5

Proje No	2012K120690 (İNŞAAT)
Proje Adı	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016

6

Proje No	2012K120690 (İNŞAAT)
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2016

7

Proje No	2011H032430
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (Öğrenci Yaşam Merkezi)
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016

8

Proje No	1994I000820 (İNŞAAT)
Proje Adı	Hastane İnşaatı (600 Yataklı 117.972,84 m ²)
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2016



2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2012K120690					
Proje Adı	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP)					
Sektör/Altsektör	Teknolojik Araştırma					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	Makine-Tecizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (3.000 m ²)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	05.01.2015		Sözleşme İhale Bedeli	7.600		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)		0			0	
2015		5.719			6.108	
2016		4.155			4.155	
.....						
TOPLAM		9.874			10.263	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2012K120690					
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı					
Sektör/Altsektör	Teknolojik Araştırma					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (4.000 m ²)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.04.2015		Sözleşme İhale Bedeli	6.568		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)		0			0	
2015		3.284			3.508	
2016		5.112			5.112	
.....						
TOPLAM		8.396			8.620	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011H032430					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Öğrenci İhtiyacını Karşılama					
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	İnşaat + Donanım (Öğrenci Yaşam Merkezi)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.02.2014		Sözleşme İhale Bedeli	3.694		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.798			4.675	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)		3.385			3.811	
2015		1.285			1.372	
2016		0				
.....						
TOPLAM		4.670			5.183	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	1994I000820					
Proje Adı	Hastane İnşaatı (600 Yataklı 117.972,84 m ²)					
Sektör/Altsektör	Sağlık					
Proje Amacı	Sağlık ve Eğitim İhtiyacını Karşılama					
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	İnşaat + Makine Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	04.04.2013 (ikmal inşaatı)	Sözleşme Bedeli	İhale	99.878		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		103.941			109.527	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (1998)		209			3.216	
1999		204			2.084	
2000		152			1.083	
2001		98			422	
2002		450			1.410	
2003		2.396			6.322	
2004		4.138			9.600	
2005		4.775			10.600	
2006		5.591			10.761	
2007		9.000			16.662	
2008		12.499			20.345	
2009		21.600			35.911	
2010		5.520			8.928	
2011						
2012						
2013		34.993			44.133	
2014		90.045			102.647	
2015		16.882			18.030	
TOPLAM		208.522			291.153	



Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	





3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ✓ Yatırım Projelerindeki en önemli sorun finansman kaynağı olmakla birlikte sınırlı olan kaynaklardan kurumlar tarafından öncelik verilen projelere daha fazla kaynak ayrılması yararlı olacaktır.
- ✓ Kalkınma Bakanlığınca verilen proje numaralarının, üniversite birimlerinde alt projelere ayrılması nedeniyle yatırım ödeneklerinin; dağıtılması, konsolide edilmesi ve raporlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Toplulaştırılmış proje yerine, üniversitedeki her bir proje için ayrı bir proje numarası verilmesi ile Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve üniversite arasında uyum sağlanacak, böylece ayrılan ödenekler, ilgili proje için kullanılacağından projelerin daha kısa sürede tamamlanacağı düşünülmektedir.
- ✓ Hazine tarafından karşılanacak ödeneklerin ayrıntılı finansman programının hazırlanması aşamasında Üniversitelere inisiyatif verilmesi halinde yatırımların tamamlanma süreci daha hızlanacaktır.
- ✓ İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesinin daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması veya sözleşmeli olarak istihdam edilmesine olanak sağlanması gereklidir.
- ✓ Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması ve buna Kalkınma Bakanlığının öncülük etmesi faydalı olacaktır.
- ✓ Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi yatırımların daha verimli ve hızlı sonuçlanmasına katkı sunacağını düşünüyoruz.
- ✓ Üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı artırılmalıdır.
- ✓ Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyumsuzlıklara sebep olmaktadır.
